

## INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS DEL SGR – PRIMER SEMESTRE 2024

### 1. GENERALIDADES

#### 1.1. GERENTE

**Tabla 1.** Información del Gerente.

NO.	NOMBRE	ENTIDAD	ACTO ADMINISTRATIVO DE NOMBRAMIENTO	CARGO
1.	EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO	EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA ENELAR E.S.P.	Decreto 011 del 04 de enero de 2024 – Gobernación de Arauca.  Acta de posesión No. 010 del 04 de enero de 2024 – Emitida por la Gobernación de Arauca.	GERENTE

Fuente: Gerencia

#### 1.2. Generalidades del Capítulo Independiente de Inversiones con cargo al Sistema General de Regalías

**Tabla 2.** Generalidades del Capítulo Independiente de inversiones con cargo al SGR

NO.	INSTRUMENTO DE PLANEACIÓN	ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN
1.	PLAN PARTICIPATIVO DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL DE ARAUCA 2024-2027	ORDENANZA 161 DE 2024	07/06/2024

Fuente: Gaceta Departamental, <https://www.arauca.gov.co/gobernacion/normatividad/gaceta-departamental>

### 2. ASPECTOS FINANCIEROS

#### 2.1. Presupuesto de la Entidad Bienio 2023-2024

**Tabla 3.** Ejecución presupuestal Sistema General de Regalías 2023-2024- Departamento de Arauca

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR)	ASIGNACIONES DIRECTAS - IES 5%  ARTICULO 40 DE LA LEY 2056	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL - DEPARTAMENTOS ARTICULO 209. 2021	SUBTOTAL
ASIGNACIONES DIRECTAS (20% DEL SGR).	LEY 2072 DE 2020 (CORRIENTES)	77.608.675.805,00	4.172.509.452,00		83.450.189.038,00
	ASIGNACIONES DIRECTAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS LEY 2072 DE 2020 PÁGINA 205	2.469.450.291,00			2.469.450.291,00
	DECRETO 317 DE 2021 DISPONIBILIDAD INICIAL 2021-2022	53.485.173.447,51			53.485.173.447,51
	DECRETO 317 DE 2021 SALDO DEL MAYOR RECAUDO 2017-2018	628.982.540,14			628.982.540,14

	DECRETO 322 DE 2021 DESAHORRO CAIDA 2020	6.902.879.436,01			6.902.879.436,01
	DECRETO 850 DE 2021 RENDIMIENTOS FINANCIEROS AD 1	3.010.054.149,07			3.010.054.149,07
	DECRETO 1741 DE 2021 DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIONES DIRECTAS	11.184.459.866,64			11.184.459.866,64

## 2.2. Proyectos Aprobados

Durante el primer semestre del año 2024 no se han aprobado proyectos nuevos, a corte de 30/06/2024.

## 3. DETALLE DE PROYECTOS APROBADOS (EJECUTOR EMPRESA DE ENERGIA DE ARAUCA).

A continuación, se presenta la información relacionada de (11) proyectos, donde es designado la Empresa de Energía de Arauca como entidad ejecutora, discriminados así:

### 3.1 Proyectos en Ejecución.

#### 3.2.1 Proyecto: ampliación electrificación distrito flor amarillo en el municipio de Tame, departamento de Arauca.

**Tabla 4.** Proyecto 2018005810020

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO	AMPLIACIÓN ELECTRIFICACIÓN DISTRITO FLOR AMARILLO EN EL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CODIGO BPIN	2018005810020
CONTRATOS DERIVADOS	OBRA: 575 DEL 26/12/2018 INTERVENTORIA: 577 DEL 26/12/2018
ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY	EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	01/05/2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	31/12/2022
PLAZO DEL PROYECTO	9 MESES
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (GESPROY)	92,39%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA (GESPROY)	89,79%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CERTIFICACION GERENCIA DEL 06/12/2018
ENFOQUE DIFERENCIAL	NO APLICA
OBJETIVO (IMPACTO)	Proveer de mayor capacidad de energía en el área rural del Municipio de Tame.
PRODUCTO PRINCIPAL	Redes del sistema de distribución local ampliada.
MEDIDO A TRAVÉS DE	kilómetros
META	56.9

**3.2.2** Proyecto: construcción de redes eléctricas en las veredas Barranca Amarilla Caracol, Sinaí, Cabuyare, Todos los Santos, la Bendición, Nubes b, Merecure en el municipio de Arauca; Altamira, la Primavera, Caracoles y Pavo Real municipio de Fortul departamento Arauca.

**Tabla 6.** Proyecto 2021005810127

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE REDES ELÉCTRICAS EN LAS VEREDAS BARRANCA AMARILLA CARACOL SINÁI CABUYARE TODOS LOS SANTOS LA BENDICIÓN NUBES B MERECURE EN EL MPIO DE ARAUCA ALTAMIRA LA PRIMAVERA CARACOLE Y PAVO REAL MPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO ARAUCA.
CODIGO BPIN	2021005810127
CONTRATOS DERIVADOS	OBRA: 531 DEL 02/02/2022
	INTERVENTORIA: 535 DEL 02/02/2022
	APOYO A LA SUPERVISIÓN: 541 DEL 03/02/2022
ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY	EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	01/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	30/06/2023
PLAZO DEL PROYECTO	11 MESES
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (GESPROY)	86,03%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA (GESPROY)	90,81%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CERTIFICACION GERENCIA DEL 04/10/2021
ENFOQUE DIFERENCIAL	NO APLICA
OBJETIVO (IMPACTO)	Proveer de mayor capacidad de energía en el área rural de los municipios de Arauca, y Fortúl
PRODUCTO PRINCIPAL	Redes del sistema de distribución local construida (Producto principal del proyecto)
MEDIDO A TRAVÉS DE	kilómetros
META	63.65

**3.2.3** Proyecto: reposición y modernización de las líneas de subtransmisión a 34.5 KV en los municipios de Arauca, Arauquita y Cravo Norte del departamento de Arauca.

**Tabla 6.** Proyecto 2023005810018

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO	REPOSICION Y MODERNIZACION DE LAS LINEAS DE SUBTRANSMISION A 34.5 KV EN LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA, ARAUQUITA Y CRAVO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CODIGO BPIN	2023005810018
CONTRATOS DERIVADOS	OBRA: 353 DEL 17/05/2023
	INTERVENTORIA: 352 DEL 17/05/2023
	APOYO A LA SUPERVISIÓN: 355 DEL 17/05/2023

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY	EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	23/06/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	31/07/2024
PLAZO DEL PROYECTO	11 MESES
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (GESPROY)	76,47%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA (GESPROY)	79,02%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CERTIFICACION GERENCIA DEL 10/04/2023
ENFOQUE DIFERENCIAL	NO APLICA
OBJETIVO (IMPACTO)	Mejorar la calidad del servicio y disponer de oferta de energía para nuevos proyectos en los municipios de Arauca, Arauquita y Cravo Norte.
PRODUCTO PRINCIPAL	Kilómetros de líneas de subtransmisión de 34.5 kv repotenciadas y modernizadas en los municipios de Arauca, Arauquita y Cravo norte
MEDIDO A TRAVÉS DE	kilómetros
META	308.62

### 3.2.4 Proyecto: construcción de redes de distribución de energía eléctrica en el centro poblado Caranal del municipio de Fortul departamento de Arauca.

**Tabla 6.** Proyecto 2023005810054

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CENTRO POBLADO CARANAL DEL MUNICIPIO DE FORTUL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CODIGO BPIN	2023005810054
CONTRATOS DERIVADOS	OBRA: 523 DEL 24/07/2023
	INTERVENTORIA: 516 DEL 28/06/2023
	APOYO A LA SUPERVISIÓN: 458 DEL 27/06/2023
ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY	EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	01/11/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	31/05/2024
PLAZO DEL PROYECTO	11 MESES
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (GESPROY)	67,05%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA (GESPROY)	49,50%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CERTIFICACION GERENCIA DEL 04/05/2023
ENFOQUE DIFERENCIAL	NO APLICA
OBJETIVO (IMPACTO)	Incrementar la disponibilidad de energía eléctrica en el centro poblado Caranal del área rural del Municipio de Fortul.
PRODUCTO PRINCIPAL	Redes del sistema de distribución local construida (Producto principal del proyecto)
MEDIDO A TRAVÉS DE	kilómetros
META	6.01

**3.2.5 Proyecto: ampliación de la electrificación en las veredas mata oscura san juan de Reintera, el Sinaí en el municipio de Arauquita departamento de Arauca.**

**Tabla 6.** Proyecto 2023005810083

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO	AMPLIACIÓN DE LA ELECTRIFICACIÓN EN LAS VEREDAS MATA OSCURA SAN JUAN DE REINTERA EL SINAÍ EN EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
CODIGO BPIN	2023005810083
CONTRATOS DERIVADOS	OBRA: 589 DEL 30/11/2023
	INTERVENTORIA: 592 DEL 04/12/2023
	APOYO A LA SUPERVISIÓN: 595 DEL 11/12/2023
ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY	EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	01/02/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	31/07/2024
PLAZO DEL PROYECTO	06 MESES
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (GESPROY)	67,00%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA (GESPROY)	48,10%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CERTIFICACION GERENCIA DEL 04/09/2023
ENFOQUE DIFERENCIAL	NO APLICA
OBJETIVO (IMPACTO)	Incrementar la disponibilidad de energía eléctrica en el área rural del Municipio de Arauquita.
PRODUCTO PRINCIPAL	Redes del sistema de distribución local construida (Producto principal del proyecto)
MEDIDO A TRAVÉS DE	kilómetros
META	11.6

**3.2.6 Proyecto: implementación de sistemas de energía solar fotovoltaica en la zona rural de los municipios de Arauca y Cravo Norte en el departamento de Arauca.**

**Tabla 6.** Proyecto 2023005810182

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO	IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN LA ZONA RURAL DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUCA Y CRAVO NORTE EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
CODIGO BPIN	2023005810182
CONTRATOS DERIVADOS	OBRA: 598 DEL 19/12/2023
	INTERVENTORIA: 599 DEL 19/12/2023
	APOYO A LA SUPERVISIÓN: 603 DEL 20/12/2023
ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY	EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	01/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	31/11/2024
PLAZO DEL PROYECTO	08 MESES

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (GESPROY)	4,63%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA (GESPROY)	49,23%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CERTIFICACION GERENCIA DEL 31/10/2023
ENFOQUE DIFERENCIAL	NO APLICA
OBJETIVO (IMPACTO)	Incrementar los sistemas de provisión de energía en las viviendas de la zona rural de los municipios de Arauca y Cravo Norte.
PRODUCTO PRINCIPAL	Unidades de generación fotovoltaica de energía eléctrica instaladas (Producto principal del proyecto)
MEDIDO A TRAVÉS DE	Unidad
META	25.0

### 3.2.7 Proyecto: construcción de redes de distribución de energía eléctrica en el municipio de Arauca departamento de Arauca.

**Tabla 6.** Proyecto 2023005810195

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción de redes de distribución de energía eléctrica en el municipio de Arauca Departamento de Arauca
CODIGO BPIN	2023005810195
CONTRATOS DERIVADOS	OBRA: 618 DEL 29/12/2023
	INTERVENTORIA: 615 DEL 29/12/2023
	APOYO A LA SUPERVISIÓN: 606 DEL 20/12/2023
ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY	EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	01/04/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	30/09/2024
PLAZO DEL PROYECTO	06 MESES
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (GESPROY)	9,50%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA (GESPROY)	46,10%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CERTIFICACION GERENCIA DEL 17/10/2023
ENFOQUE DIFERENCIAL	NO APLICA
OBJETIVO (IMPACTO)	Incrementar la disponibilidad de energía eléctrica en el Municipio de Arauca
PRODUCTO PRINCIPAL	Redes del sistema de distribución local construida (Producto principal del proyecto)
MEDIDO A TRAVÉS DE	Kilómetros
META	4.84

**3.2.8** Proyecto: ampliación de la electrificación por redes en media y baja tensión en el área rural de los municipios de Arauca y Puerto Rondón en el departamento de Arauca.

**Tabla 6.** Proyecto 2023005810198

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO	Ampliación de la electrificación por redes en media y baja tensión en el área rural de los municipios de Arauca y Puerto Rondón en el Departamento de Arauca
CODIGO BPIN	2023005810198
CONTRATOS DERIVADOS	OBRA: 608 DEL 21/12/2023
	INTERVENTORIA: 612 DEL 21/12/2023
ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY	EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	11/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	31/10/2024
PLAZO DEL PROYECTO	06 MESES
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (GESPROY)	28,09%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA (GESPROY)	49,25%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CERTIFICACION GERENCIA DEL 05/12/2023
ENFOQUE DIFERENCIAL	NO APLICA
OBJETIVO (IMPACTO)	Incrementar la disponibilidad de energía eléctrica en la zona rural de los Municipios de Arauca y puerto Rondón
PRODUCTO PRINCIPAL	Redes del sistema de distribución local construida (Producto principal del proyecto)
MEDIDO A TRAVÉS DE	Kilómetros
META	8.64

**3.2.9** Proyecto: construcción de redes eléctricas en media y baja tensión para el proyecto de vivienda de interés social prioritario sector barrio costa hermosa en el municipio de Arauca departamento de Arauca.

**Tabla 6.** Proyecto 2023005810216

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO	Construcción DE REDES ELECTRICAS EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA EL PROYECTO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL PRIORITARIO SECTOR BARRIO COSTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA DEPARTAMENTO DE Arauca
CODIGO BPIN	2023005810216
CONTRATOS DERIVADOS	OBRA: 616 DEL 29/12/2023
	INTERVENTORIA: 617 DEL 29/12/2023
ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY	EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	01/03/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	28/06/2024
PLAZO DEL PROYECTO	06 MESES
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (GESPROY)	39,18%

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA (GESPROY)	49,99%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CERTIFICACION GERENCIA DEL 14/12/2023
ENFOQUE DIFERENCIAL	NO APLICA
OBJETIVO (IMPACTO)	Garantizar infraestructura de redes de distribución para atender la demanda actual de energía eléctrica en el área urbana del municipio de Arauca
PRODUCTO PRINCIPAL	Redes del sistema de distribución local construida (Producto principal del proyecto)
MEDIDO A TRAVÉS DE	Kilómetros
META	1.52

**3.2.10 Proyecto: ampliación electrificación veredas Villa Nueva, la Cabaña, la Salve, la Unión, Palo de Agua, la Colorada, Bajo Quiripal, Caño Negro, la Esperanza, Palmarito, Nuevo Caranal, las Orquídeas y el Tigre en el municipio de Fortul, departamento de Arauca.**

**Tabla 6.** Proyecto 20201301010093

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO	Ampliación Electrificación veredas Villa nueva, La cabaña, La salve, La unión, Palo de agua, La colorada, Bajo Quiripal, Caño negro, La esperanza, Palmarito, Nuevo Caranal, Las Orquídeas y El tigre en el Municipio de Fortul, Departamento de Arauca.
CODIGO BPIN	20201301010093
CONTRATOS DERIVADOS	OBRA: 469 DEL 23/02/2021 INTERVENTORIA: 498 DEL 23/02/2021
ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY	EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	01/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	30/06/2022
PLAZO DEL PROYECTO	04 MESES
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (GESPROY)	86,22%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA (GESPROY)	86,32%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CERTIFICACION GERENCIA DEL 31/08/2020
ENFOQUE DIFERENCIAL	NO APLICA
OBJETIVO (IMPACTO)	1-Proveer de mayor capacidad de energía en el área rural del Municipio. de Fortul. 2-Proveer de mayor capacidad de energía en el área rural del Municipio. 3- proveer de mayor capacidad de energía en el área rural del Municipio de Fortul.
PRODUCTO PRINCIPAL	1-Redes del sistema de distribución local construida. 2- Redes del sistema de transmisión regional ampliada. 3- Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas
MEDIDO A TRAVÉS DE	Kilómetros. Kilómetros de redes del Sistema de transmission regional. Número de viviendas.
META	12.41 39.99 251.00



**3.2.11 Proyecto: ampliación electrificación veredas Cubiloto, Lejanias, las Nubes, Normandía y el Progreso, distritos Mararabe, Centro, la Sabana y Purare en el municipio de Tame y el centro poblado Puerto Jordán departamento de Arauca**

**Tabla 6.** Proyecto 20201301010101

ÍTEM	DESCRIPCIÓN
NOMBRE DEL PROYECTO	Ampliación ELECTRIFICACIÓN VEREDAS CUBILOTO, LEJANIAS, LAS NUBES, NORMANDIA Y EL PROGRESO, DISTRITOS MARARABE, CENTRO, LA SABANA Y PURARE EN EL MUNICIPIO DE TAME Y EL CENTRO POBLADO PUERTO JORDAN DEPARTAMENTO DE Arauca.
CODIGO BPIN	20201301010101
CONTRATOS DERIVADOS	OBRA: 470 DEL 23/02/2021
	INTERVENTORIA: 490 DEL 23/02/2021
ESTADO DEL PROYECTO EN GESPROY	EJECUCIÓN
FECHA DE INICIO DEL PROYECTO	01/03/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PROYECTO	31/01/2023
PLAZO DEL PROYECTO	19 MESES
% DE EJECUCIÓN FÍSICA (GESPROY)	36,36%
% DE EJECUCIÓN FINANCIERA (GESPROY)	75,04%
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS	CERTIFICACION GERENCIA DEL 10/09/2020
ENFOQUE DIFERENCIAL	NO APLICA
OBJETIVO (IMPACTO)	1-Proveer de mayor capacidad de energía en el área rural del Municipio de Tame y Arauquita. 2-Proveer de mayor capacidad de energía en el área rural del Municipio de Tame y Arauquita. 3- Proveer de mayor capacidad de energía en el área rural del Municipio de Tame y Arauquita. 4- Proveer de mayor capacidad de energía en el área rural del Municipio de Tame y Arauquita.
PRODUCTO PRINCIPAL	1-Redes del sistema de distribución local construida. 2-Redes del sistema de transmisión regional ampliada. 3-Redes domiciliarias de energía eléctrica instaladas. 4-Redes internas de energía eléctrica instaladas.
MEDIDO A TRAVÉS DE	Kilómetros. Kilómetros de redes del sistema de transmisión regional. Número de viviendas. Número de viviendas.
META	16.04 401.99 1328 1318

## 4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA INVERSIÓN


### 4.1 Índice de Gestión de Proyectos

El Índice de Gestión de Proyectos de Regalías – IGPR es una herramienta de gestión y control preventivo, creada a partir de la información registrada por las entidades ejecutoras de los proyectos de inversión aprobados y financiados total o parcialmente con recursos del SGR y de las acciones del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control - SSEC.

El enfoque conceptual y metodológico del IGPR se centra en el desempeño de los proyectos de inversión a través del criterio de cobertura de información: completa, consistente, oportuna y el criterio de eficiencia: en términos del cumplimiento de alcance, tiempo y costo.

Para el I Trimestre de 2024 La empresa de energía de Arauca ENELAR E.S.P. presento un IGPR de 76.2 puntos, ubicándose en rango **ALTO**. Como se muestra en la siguiente figura:


**Ilustración 1.** Resultados Índice de Gestión de Proyectos Primer Trimestre de 2024

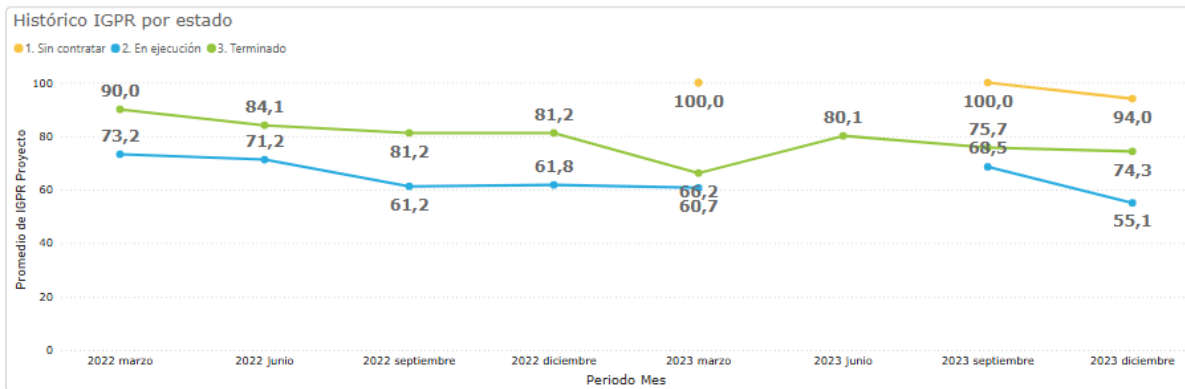

Fuente: Aplicativo IGPR- DNP

Sin embargo, actualmente con la implementación de la nueva metodología de medición del IGPR, la Empresa de energía de Arauca ENELAR E.S.P. ocupa 46 entre 114 empresas de similares características.

**Ilustración 2.** Medición del IGPR 1er. trimestre 2024

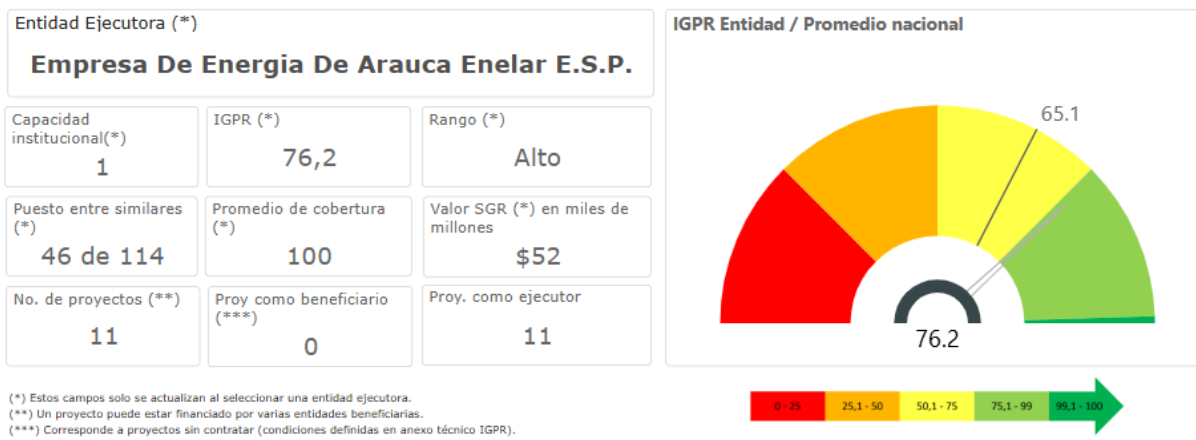


Fuente: Aplicativo IGPR- DNP

## 4.2 Análisis del Estado de los Proyectos en GESPROY

La empresa de energía de Arauca ENELAR E.S.P. (entidad ejecutora) cuenta con un total de veintisiete (27) proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías, sin embargo. A continuación, se presenta la gráfica de la totalidad de proyectos reportados en Gesproy 3.0 con sus respectivos estados:

**Gráfica 3.** Estado de los proyectos en GESPROY

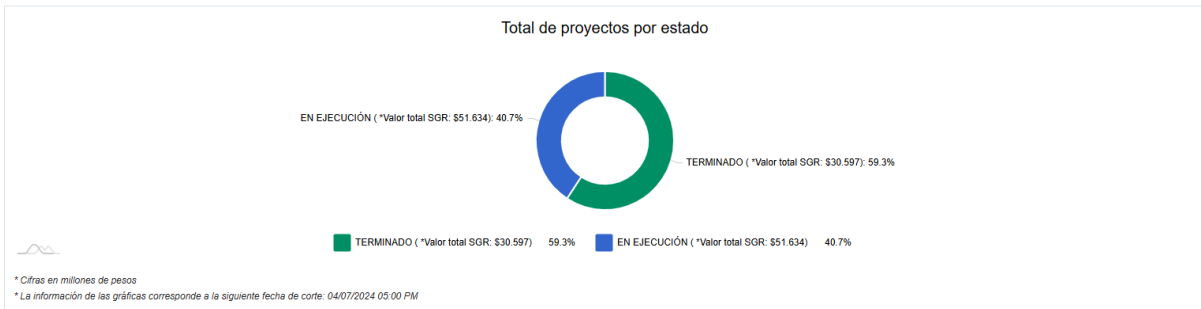

**Fuente:** *Aplicativo GESPROY*

Como se muestra en la gráfica anterior, el valor total de los veintisiete (27) proyectos financiados con recursos del SGR existentes en la plataforma Gesproy, equivale a ochenta y dos mil doscientos treinta y un millones (\$82.231.000.000).

La mayoría de los proyectos se encuentran en estado TERMINADO, con un total de dieciséis (16) proyectos y once (11) proyectos en estado EJECUCION.

El presente informe se firma a los 04 días del mes de julio de 2024.



**EDGAR ALONSO REYES CHAPARRO**  
Gerente ENELAR E.S.P.

**Proyectó:** Ernesto Briceño Granados Subdirector TOPMA Proyectos *EH*
